


CampusCafé 17 april 2024

Update voortgang bouw MFA De Braak



Gebouw Oost

- Wandbekleding, schilderwerk, en vloeren natte ruimten zijn aangevangen.
- Montage geprofileerd gevelplaat is aangevangen.
- Sportvloeren staan gepland week 18-19-20.
- Vloerbedekking staat gepland circa week 19.
- Montage lamellen gepland circa week 18.

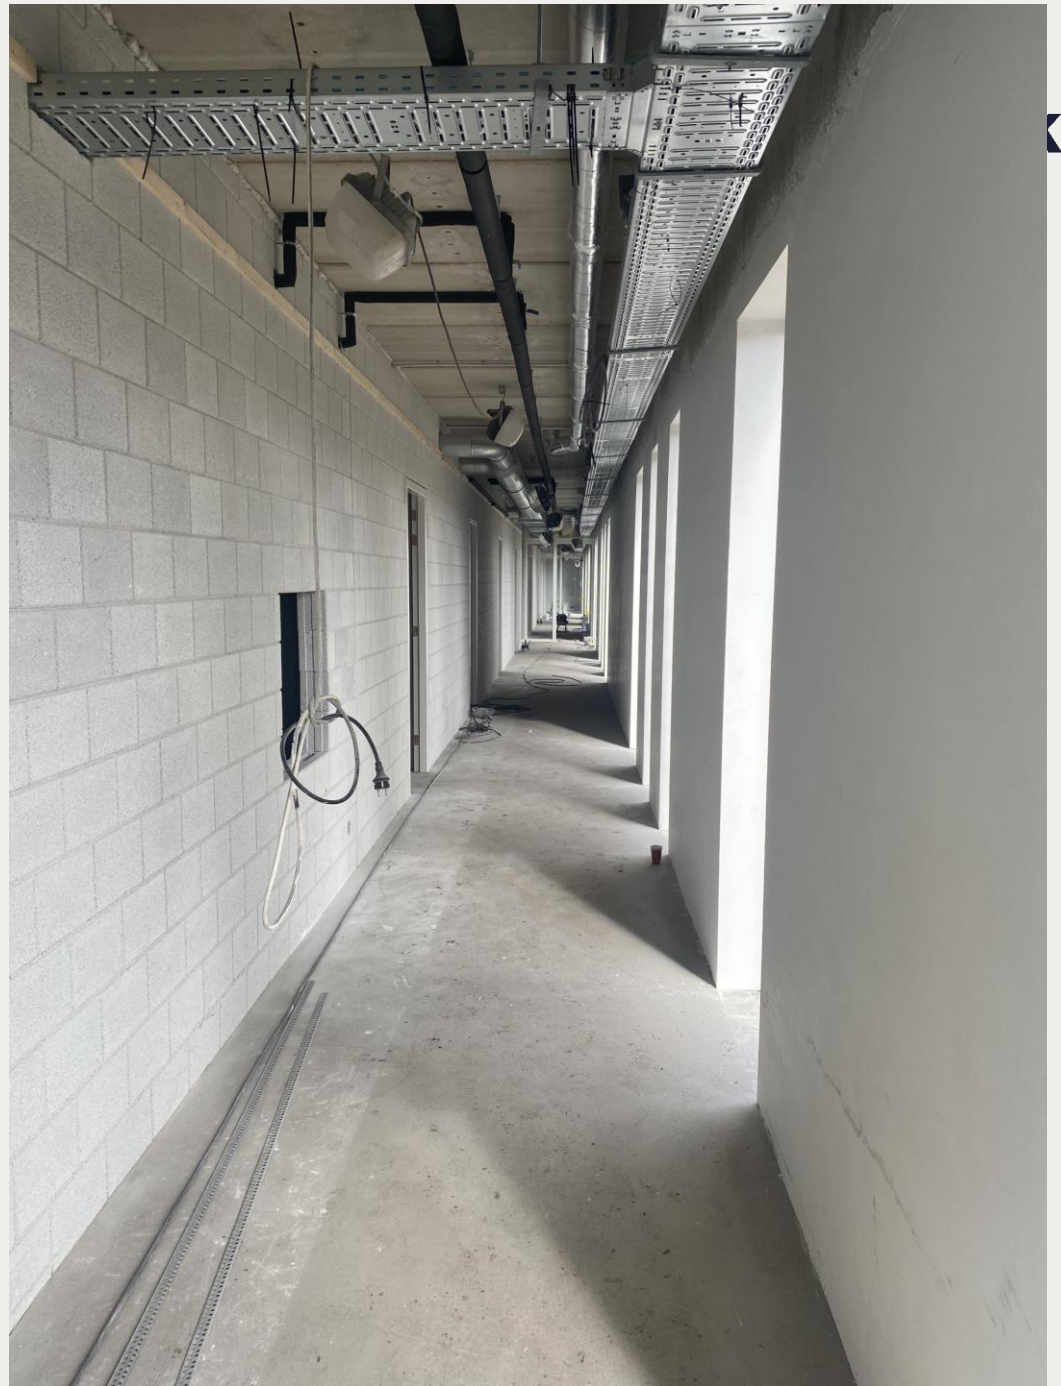













Gebouw West

- Sluiten MS-wanden loopt op een einde.
- Plafondraster op de verdieping is aangevangen.
- Montage geprofileerde gevelplaat aansluitend aan oost circa week 17.
- Montage lamellen aansluitend aan oost.
- Aanvang wandbekleding / schilderwerk circa week 18/19.
- Aanvang vloerbedekking circa week 19.










Stadion

- Montage lichtmasten week 21-22-23.
- Voeding trafo binnen brengen week 16.







DE/BRAAK
CAMPUS

